


# 曲靖市马龙区养老服务中心项目施工总进度计划




说明: 1、本计划为考虑春节等节假日的影响;  
 2、本计划项目分为综合楼一、二、三区、室外构筑物、室外道路、绿化等部分分别实施;  
 3、综合楼一、二、三区、室外构筑物基础、主体、屋面、装饰等分别实施;  
 4、综合楼一、二、三区、室外构筑物、室外道路、绿化等部分分别实施。

项目负责人	孙石清	文件名	新工总进度计划
绘图人	董树波	总工期(含假期)	365天
审核人	高良健	总工期(工日)	365天
校对人	费志国	备注:	
起始时间	2023-12-08		
完成时间	2024-12-06		
班马进度计划软件制作			

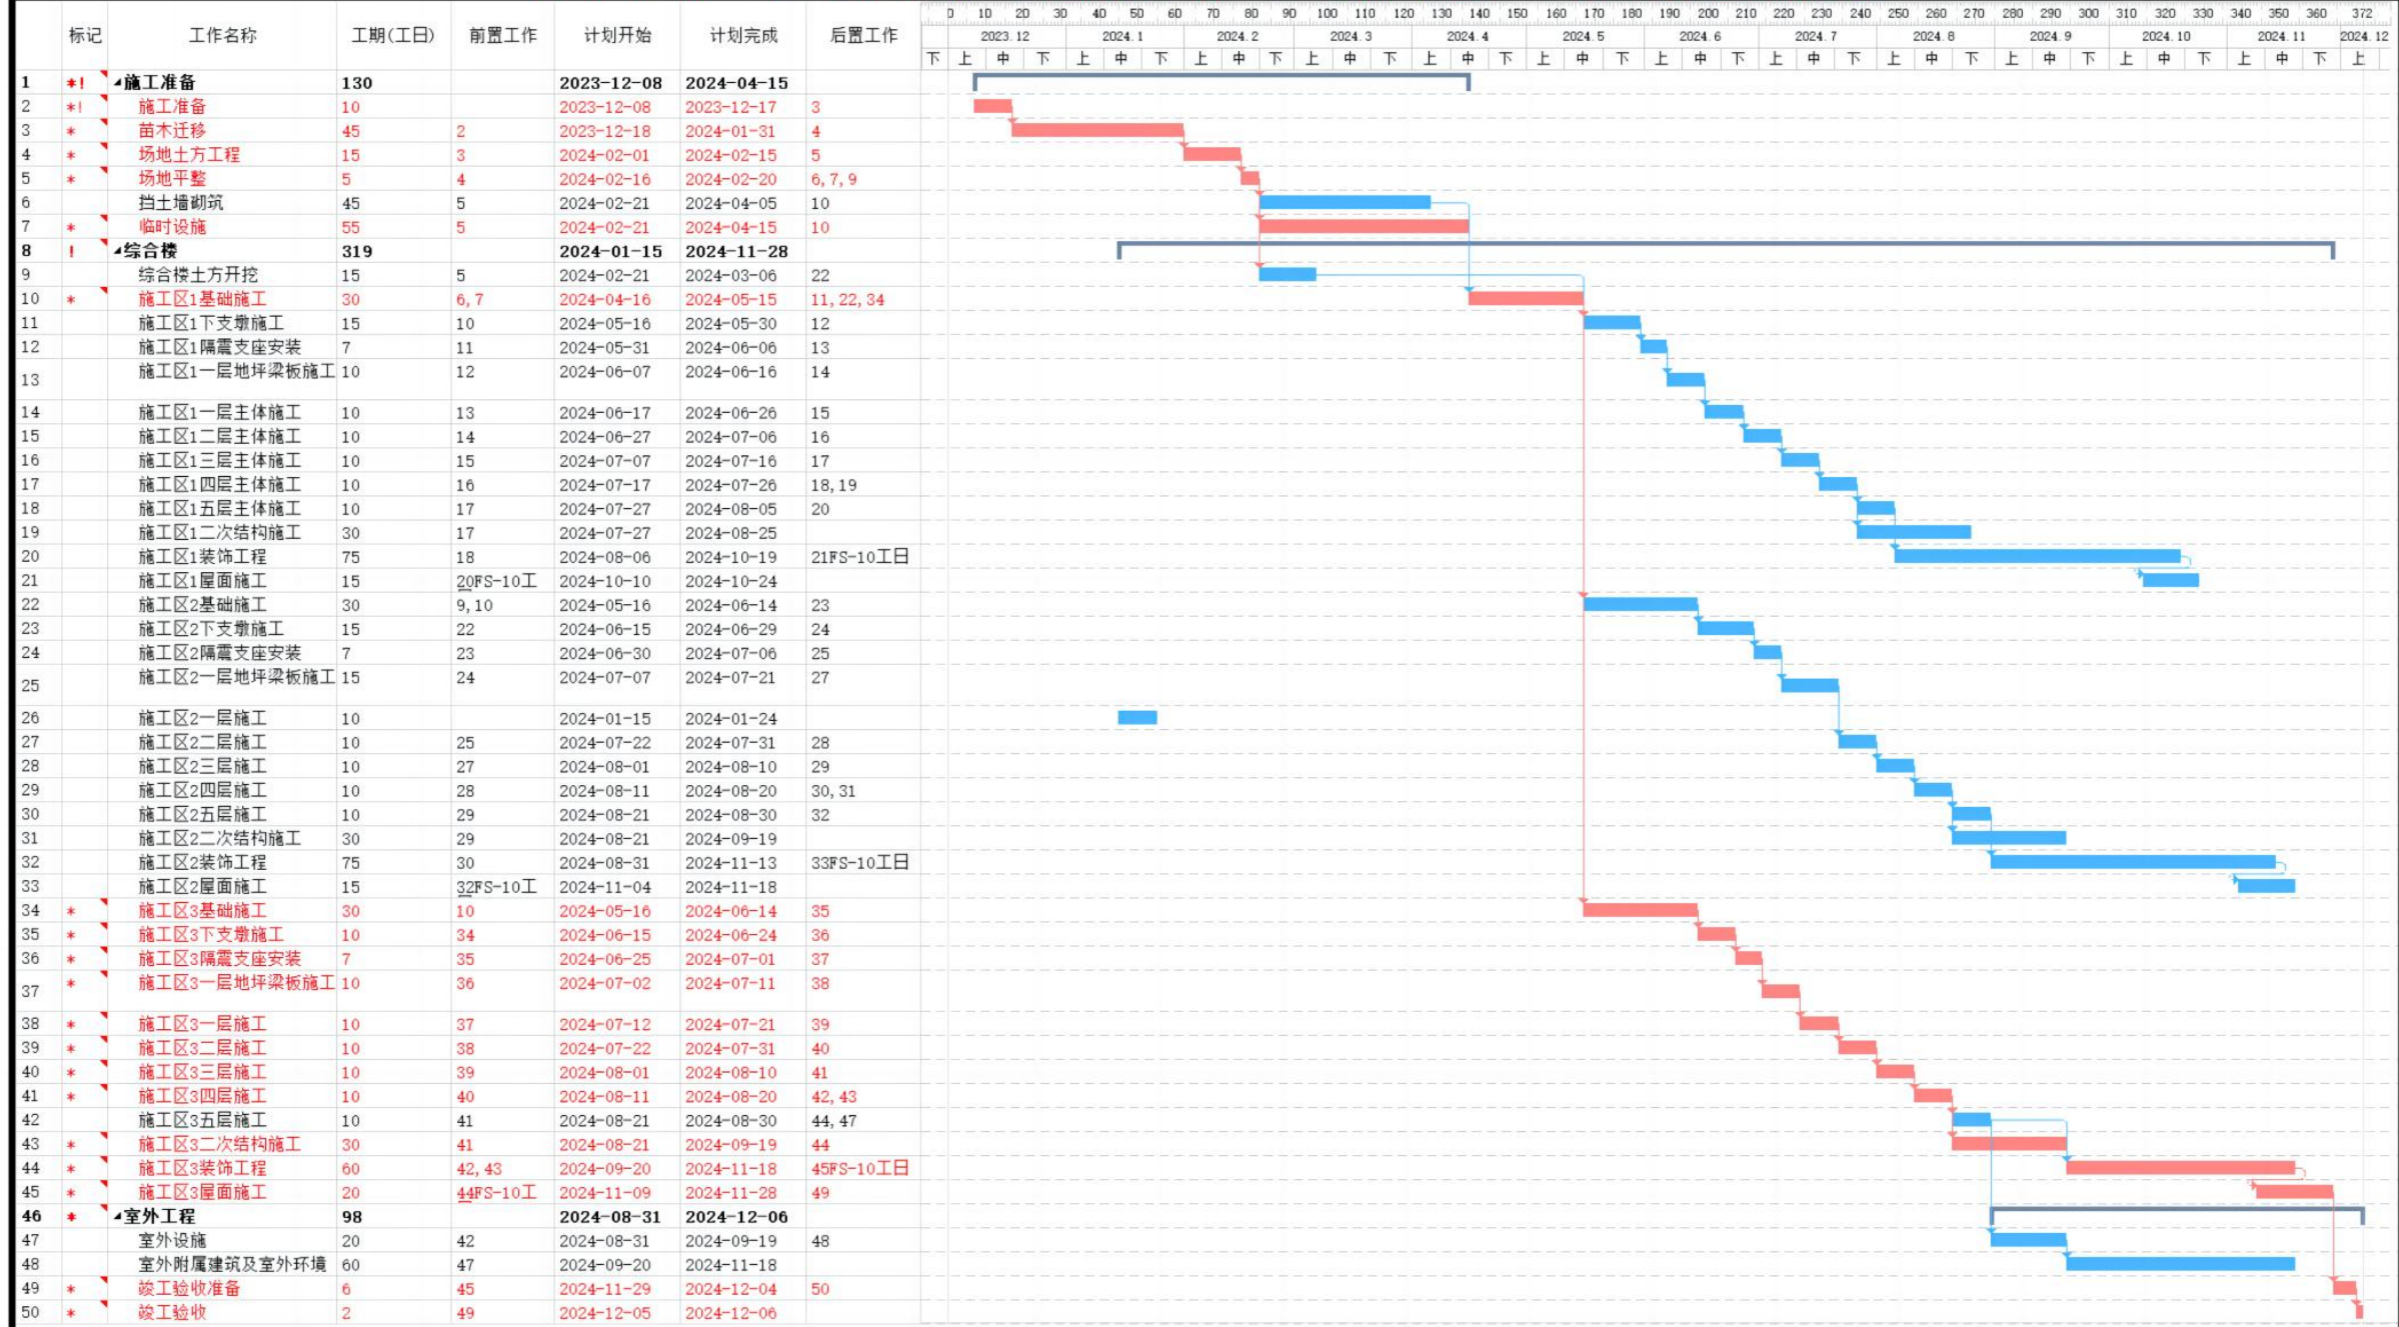

# 曲靖市马龙区养老服务中心项目施工总进度计划

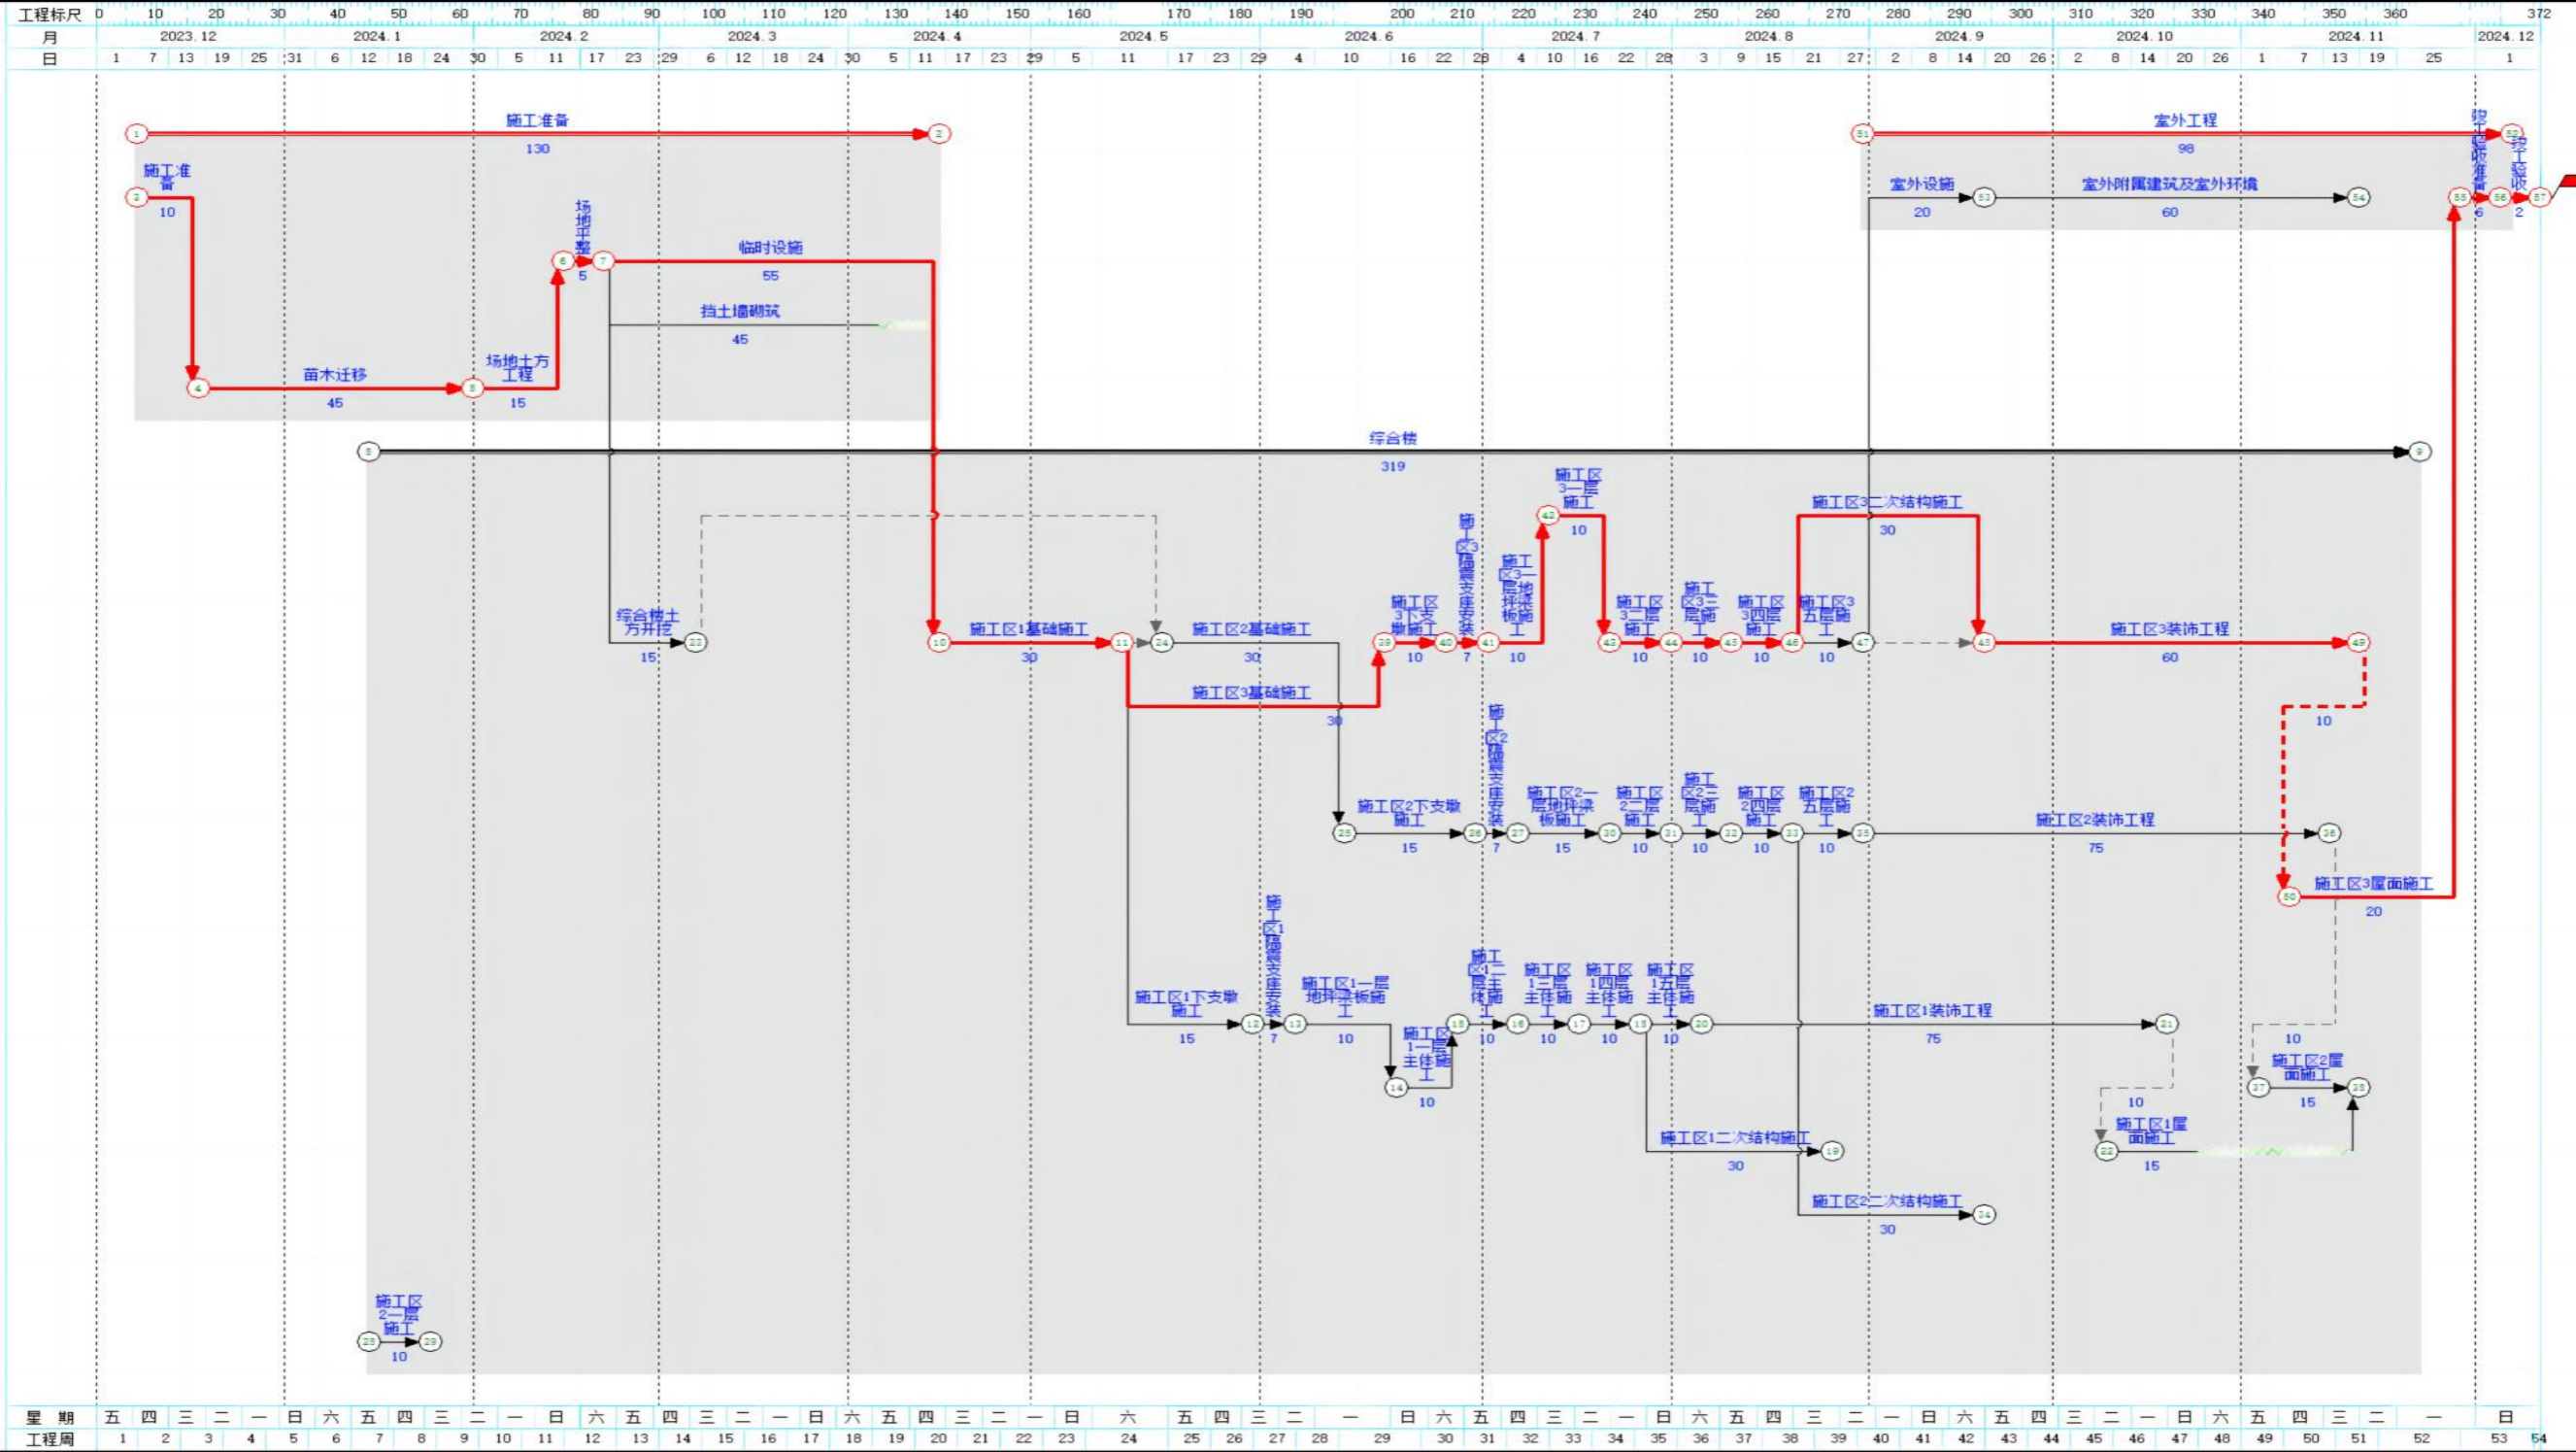

说明：1、本计划为考虑春节等节假日的影响；  
 2、本计划项目分为综合楼一区、二区、三区、室外构筑物、室外道路、绿化等部分分别实施；  
 3、综合楼一、二、三区、室外构筑物基础、主体、屋面、装饰装修采用流水施工；  
 4、综合楼一区为1-12轴/A-E轴，综合楼二区为1-4轴/F-M轴，综合楼三区为9-12轴/F-M轴。

项目负责人	孙石青	文件名	施工总进度计划
绘图人	董树波	总工期(含假期)	365天
审核人	高良健	总工期(工作日)	365天
校对	费志国	备注:	
起始时间	2023-12-08		
完成时间	2024-12-06		
斑马进度计划软件制作			

## 主要节点里程碑形象进度计划

序号	工作	持续时间	开始时间	结束时间	备注
1	施工准备	10	2023-12-08	2023-12-17	
2	苗木迁移	45	2023-12-18	2024-1-31	
3	场地土方工程	15	2024-02-01	2024-02-15	
4	挡土墙	45	2024-02-01	2024-03-16	
5	场地平整	5	2024-02-16	2024-02-20	
6	临时设施建设	55	2024-02-21	2024-04-15	
7	混凝土基础施工	30	2024-04-16	2024-05-16	
8	主体结构施工	103	2024-06-17	2024-08-30	
10	二次结构工程	68	2024-07-27	2024-9-19	
11	屋面施工	48	2024-10-10	2024-11-28	
12	装饰装修工程	102	2024-08-06	2024-11-18	
13	室外设施	50	2024-08-30	2024-9-19	
14	室外附属建筑及室外环境	69	2024-09-19	2024-11-28	
15	竣工验收准备	5	2024-11-29	2024-12-04	
16	竣工验收	2	2024-12-05	2024-12-06	
